Kế hoạch thực tập 6 tuần – Bản thực tập sinh

Oct 30, 2026 · @Jackie

Bạn có 6 tuần để tự định hướng bài toán, chứng minh giá trị của nó và làm MVP cùng đồng đội. Tài liệu này nói khi nào cần nộp gì và được chấm thế nào, nội dung các bạn sẽ tự thống nhất với nhau và xác nhận từ mentor trực tiếp.

Tổng quan

Kỳ thực tập chạy từ thứ Năm 29/10/2026 đến thứ Tư 09/12/2026, gồm 33 ngày làm việc chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn	Thời lượng	Ngày	Mốc kết thúc
1. Tự lập kế hoạch, thống nhất tiêu chí với mentor	1 tuần	29/10 – 04/11	Gate 0 (04/11)
2. Revise, dựng skeleton kiểm chứng kế hoạch	1 tuần	05/11 – 11/11	Gate 1 (11/11)
3. Thực thi: 2 mini sprint, 3 checkpoint	4 tuần	12/11 – 09/12	CP1 (18/11), CP2 (25/11), CP3 (09/12)

Ghép cặp: 6 thực tập sinh làm thành 3 cặp. Mỗi người có bài toán riêng; mỗi cặp tự tìm cách để hai bài toán bổ trợ nhau (xem phần Teamwork và điểm cộng).

Cặp	Thành viên 1	Thành viên 2
A	Đoàn Tuấn Long	Đàm Quang Trung
B	Nguyễn Thế Khang	Võ Doanh Nhân
C	Nguyễn Ngọc Vĩnh	Nguyễn Đức Anh

Quy ước lịch:


- Một tuần tính từ thứ Năm đến thứ Tư. Mọi gate và checkpoint diễn ra vào chiều thứ Tư.
- Thứ 7 nghỉ /làm xen kẽ: nghỉ 31/10, 14/11, 28/11; làm 07/11, 21/11, 05/12.

Nguyên tắc dữ liệu: đây là chương trình làm MVP. Thực tập sinh không được thao tác với dữ liệu thật dưới bất kỳ hình thức nào.

Giai đoạn	Dữ liệu được dùng
Tuần 1 – CP1 (29/10 – 18/11)	Chỉ dữ liệu mockup do bạn tự dựng
CP2 – CP3 (19/11 – 09/12)	Dữ liệu masked do mentor cung cấp

Mốc và đầu ra bắt buộc

Bạn tự lập kế hoạch chi tiết từng ngày; chương trình chỉ cố định 5 mốc dưới đây và những gì phải mang tới mỗi mốc.

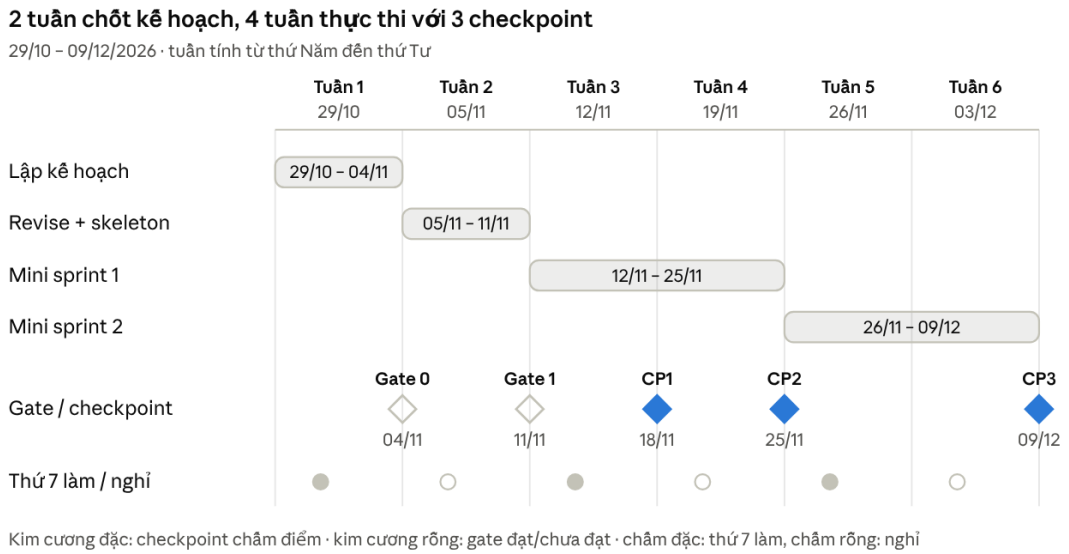

lộ trình 6 tuần · 4 giai đoạn, 5 mốc

Mốc	Ngày	Dữ liệu	Bạn cần mang tới	Kết quả
Gate 0	04/11	–	Kế hoạch 1–2 trang: vấn đề, người dùng, giá trị mang lại, phạm vi in/out, success metric đo được, kiến trúc sơ bộ. Rubric đã cụ thể hoá cho bài toán của bạn. Pair contract v0. Đặc tả bộ dữ liệu mockup. Danh sách rủi ro và phụ thuộc	Đạt / chưa đạt
Gate 1	11/11	Mockup	Skeleton chạy end-to-end. Kết quả kiểm chứng giả định rủi ro nhất. Kế hoạch đã điều chỉnh, baseline metric, backlog Sprint 1	Đạt / chưa đạt
CP1	18/11	Mockup	Demo MVP, tiến độ so với kế hoạch	Chấm điểm, 20%
CP2	25/11	Masked	Demo MVP, kết quả Sprint 1, retro	Chấm điểm, 30%
CP3	09/12	Masked	Final demo, metric đo được, tài liệu bàn giao	Chấm điểm, 50%

Sprint 1 chạy từ 12/11 đến 25/11, Sprint 2 từ 26/11 đến 09/12. Bạn nhận dữ liệu masked trong tuần 19/11 – 25/11.

Khung chấm điểm cá nhân

Mỗi checkpoint chấm 3 tiêu chí, mỗi tiêu chí 2–3–4 điểm, tối đa 12 điểm. Mô tả dưới đây cố ý để chung: tại Gate 0, bạn tự đề xuất mỗi mức nghĩa là gì với bài toán của mình, bằng con số đo được, và mentor duyệt.

Tiêu chí	2 – Đạt	3 – Tốt	4 – Xuất sắc
1. Giá trị và kết quả	MVP chạy được luồng chính; đạt một phần metric bạn tự đặt	Đạt mọi metric đã chốt trên dữ liệu masked; stakeholder đã dùng thử	Vượt metric và chứng minh giá trị bằng số liệu; stakeholder muốn đưa MVP đi tiếp
2. Chất lượng kỹ thuật	Chạy được, người khác đọc hiểu được	Chất lượng được kiểm chứng có hệ thống, kể cả phần AI; tuân thủ quy định dữ liệu	Người khác chạy lại, mở rộng và tiếp quản được mà không cần hỏi bạn
3. Thực thi và chủ động	Hoàn thành phần lớn kế hoạch	Đúng mốc, tự báo rủi ro sớm, xử lý góp ý nhanh	Tự điều chỉnh kế hoạch có căn cứ, giúp cả nhóm tiến lên

Chý ý: Details chi tiết cho mục 1, 2 từng TTS điền cho công việc của mình

```
{Điểm cá nhân} = 0.2 * CP_1 + 0.3 * CP_2 + 0.5 * CP_3 {tối đa } 12)
```

Gate 0 và Gate 1 không có điểm riêng, chỉ đạt hoặc chưa đạt; kết quả của chúng được tính vào tiêu chí 3 tại CP1.

Teamwork và điểm cộng

Mỗi người được ghép với một đồng đội có bài toán khác. Hai bài toán bổ trợ nhau thế nào là câu hỏi cặp phải tự trả lời, và đó chính là phần được thưởng điểm.

Cặp	Thành viên	Bài toán dự kiến	Liên hệ metor
A	Đoàn Tuấn Long	Áp dụng phát hiện và che PII cho dữ liệu báo cáo và log của các hệ thống, sau đó nghiên cứu mở rộng	TungNX15
A	Đàm Quang Trung	VGP/CPO đọc dữ liệu từ ảnh; FAQ/chatbot cho VGP	PhuNN4
B	Nguyễn Thế Khang	AI phân tích success factor trên dữ liệu vận hành, đưa ra open point và đề xuất; tự động monitoring critical service	MuoiHV
B	Võ Doanh Nhân	Cảnh báo dạng log stream/thống kê cho các hành vi	KhaiDQ5

Cặp	Thành viên	Bài toán dự kiến	Liên hệ metor
		LLM phát hiện là bất thường	
C	Nguyễn Ngọc Vĩnh	MVP SDLC AI: orchestration framework cho phát triển và kiểm thử bằng AI, SOX-ready, định hướng TDD	Sonph6
C	Nguyễn Đức Anh	Tool kết hợp AI gate tự động kiểm tra MC document và soạn email xin phê duyệt cho CIP	MinhLQ11

Pair contract v0, nộp tại Gate 0, phải trả lời được bốn câu hỏi:

1. Hai bài toán giao nhau ở đâu, và giá trị cộng hưởng là gì?
2. Mỗi người chịu trách nhiệm phần nào, ranh giới ở đâu?
3. Hai bên trao đổi gì với nhau, theo định dạng nào?
4. Khi nào tích hợp, và đo giá trị cộng hưởng bằng gì?

Mức điểm cộng	Điều kiện
1	Có pair contract được cả hai bên thực sự sử dụng
2	Tích hợp 1 chiều chạy được và demo được
3	Tích hợp 2 chiều end-to-end, đo được giá trị cộng hưởng bằng số liệu

Quy tắc:

- Điểm cộng chấm 1 lần tại CP3, hai thành viên nhận cùng mức.
- Chỉ tính khi mỗi thành viên đạt từ mức 2 trở lên ở cả 3 tiêu chí tại CP3.
- Mentor có thể giảm 1 mức cho thành viên đóng góp không cân xứng.
- Tiến độ của bạn không được phụ thuộc hoàn toàn vào đồng đội.

Nhịp làm việc và quy định

- Cặp tự sắp xếp lịch sync; mọi thay đổi của pair contract được ghi vào repo. Đề xuất 15 phút mỗi sáng; sau đó cập nhật vào file Excel tiến độ chung.
- 1:1 với mentor mỗi tuần, 30 phút; kết quả ghi vào mục “1-1 hàng tuần” trên cùng file đó.
- Gate và checkpoint vào chiều thứ Tư: demo 10 phút, hỏi đáp 5 phút; link đầu ra ghi vào sheet “Mốc”.
- Repo chỉ chứa dữ liệu mockup. Dữ liệu masked lưu tại nơi mentor chỉ định và không được commit.

- Được dùng LLM qua subscription cá nhân, vì vậy phải đặc biệt chú ý dữ liệu đưa vào: chỉ dùng mockup, hoặc dữ liệu masked trong phạm vi mentor cho phép; không đưa dữ liệu thật hay thông tin nhận diện cá nhân vào LL
